



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

Služba za razvojne projekte in investicije

Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana

t: 01 306 46 51

glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

PRVI ŠOLSKI DAN 2025/26 - Projekti SRPI MOL | avgust 2025

Vrtci in šole	2
Center Janeza Levca	2
OŠ Milana Šuštaršiča	3
OŠ Danile Kumar	5
OŠ Oskarja Kovačiča	7
OŠ Prule.....	8
Vrtec Galjevica	10
Vrtec Trnovo	12
OŠ Kolezija – Nova šola	14
OŠ Ketteja in Murna	15
OŠ Majde Vrhovnik	16

v gradnji

v pripravi



v gradnji

Center Janeza Levca

Projektant: SAMOATELJE, d. o. o.

Izvajalec: GiB GRADNJE, d. o. o.

Začetek gradnje: februar 2025

Predviden zaključek: april 2026

Vrednost gradbenih del brez DDV: 3.840.000 €

Namen in cilj projekta:

V okviru projekta je načrtovana prostorska posodobitev in dograditev obstoječega objekta. Porušili smo del starega objekta, na katerem mestu bomo **zgradili nov sodoben objekt z učnimi delavnicami** (učno kuharsko delavnico in učno mizarsko delavnico ter prostore za fizioterapijo in logopedsko terapijo). Predvidena je tudi zunanja ureditev z **novim otroškim igriščem in prilagojenim športnim igriščem** in parkirnimi mesti ter dovozi.

Arheološka izkopavanja na območju prizidka Centra Janeza Levca so potekala med februarjem in junijem 2025.



Avgust 2025 - trenutno stanje projekta:

Izvajajo se armirano-betonska dela sten.



v gradnji

OŠ Milana Šuštaršiča

Projektant: CURK ARHITEKTURA, d. o. o.

Izvajalec: MAKRO 5 GRADNJE, d. o. o.


Začetek gradnje: november 2024

Predviden zaključek gradnje: november 2025

Vrednost gradbenih del brez DDV: 7.550.000 €

Namen in cilj projekta:

Predvidena je rušitev in **novogradnja telovadnice ter delna reorganizacija osrednjega objekta** šole z obnovo kuhinje in razširitvijo jedilnice. V sklopu investicije bo urejeno tudi novo zaklonišče in zunanja šolska ploščad, ki povezuje glavna vhoda.

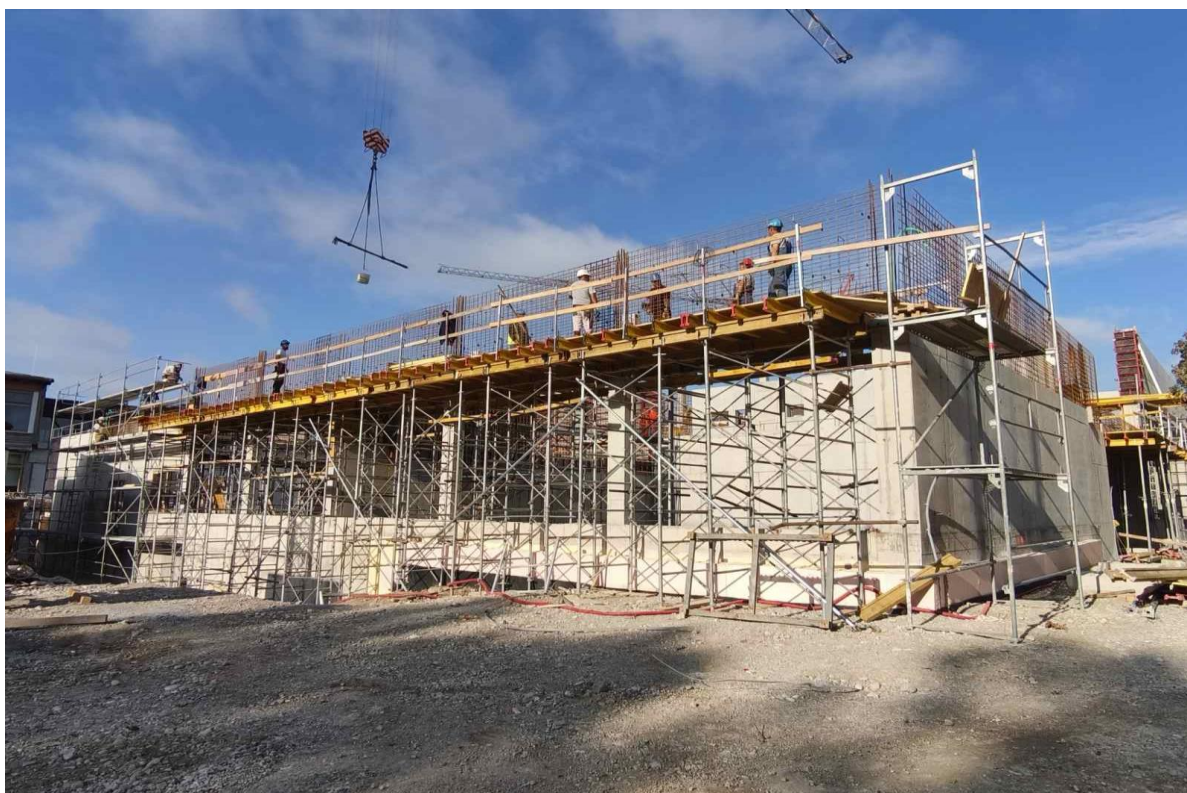

Avgust 2025 - trenutno stanje projekta:

Trenutno se izvajajo armirano-betonska dela nove telovadnice in postavljeni so leseni nosilci za streho le-te.





v gradnji

OŠ Danile Kumar

Projektant: CURK ARHITEKTURA, d. o. o.

Izvajalec: LESNINA MG OPREMA, d. o. o.

Začetek gradnje: julij 2025

Predviden zaključek: marec 2026

Vrednost gradbenih del brez DDV: 5.400.000 €


Namen in cilj projekta:

Predvidena je **celovita energetska prenova šolske stavbe** z 22-imi učilnicami in telovadnico. V okviru prenove se bo uredila tudi **požarna in potresna varnost** objekta.



Avgust 2025 - trenutno stanje projekta:

Z deli smo pričeli julija 2025. Trenutno na objektu poteka statična sanacija sten.

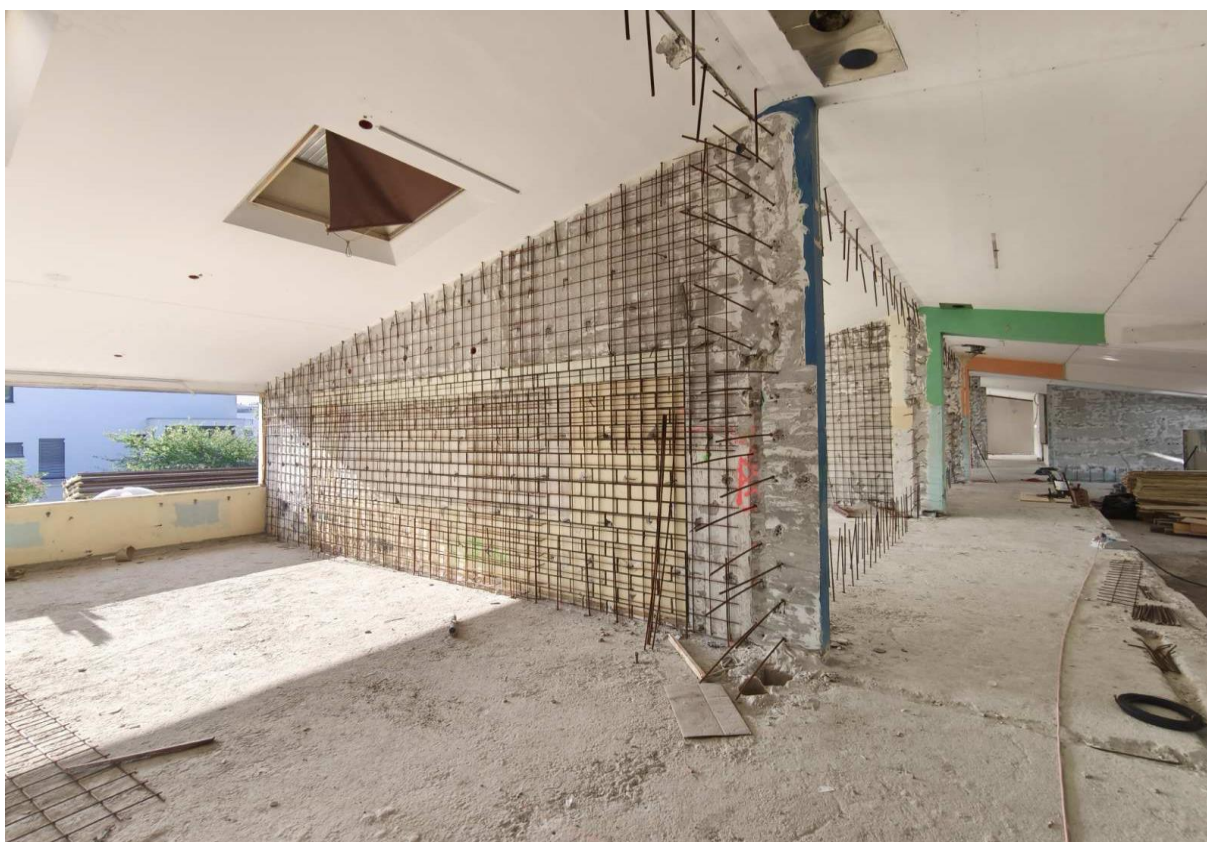



v gradnji

OŠ Oskarja Kovačiča

Projektant: CAR - POTISEK ARHITEKTI, d. o. o.

Izvajalec: LESNINA MG OPREMA, d. o. o.

Začetek gradnje: junij 2025

Predviden zaključek gradnje: november 2025

Vrednost gradbenih del brez DDV: 2.000.000 €

Namen in cilj projekta:

Projekt obsega ureditev **novega športnega igrišča** za OŠ Oskarja Kovačiča ter **dodatnih športnih površin za potrebe šole in širše okolice**, s pripadajočo prometno ureditvijo.



Avgust 2025 - trenutno stanje projekta:

Z deli smo pričeli julija 2025. Izvedeno je bilo odstranjevanje asfalta. Trenutno se izvajajo izkopi. Pripeljan je materiala za gredo in razgrnjen na območju igrišča (nov material, zgornjih 20 cm), dostavljeni PE jaški za meteorno kanalizacijo in betonirano dno le-teh,...



v gradnji

OŠ Prule

Projektant: ARHITEKTI DOBRIN, d. o. o.

Izvajalec: DEMA PLUS, d. o. o.

Začetek gradnje: julij 2025

Predviden zaključek gradnje: september 2026

Vrednost gradbenih del brez DDV: 14.500.000 €

Namen in cilj projekta:

Načrtovana investicija obsega **celovito prenovu s statično in požarno sanacijo**, rušitev stare in **gradnjo nove telovadnice** ter **celovito prenovu šolskega športnega igrišča**. Vsi ukrepi se bodo dopolnjevali z **energetsko prenovu**, ki se bo izvedla v sklopu javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva.



Avgust 2025 - trenutno stanje projekta:

Z deli smo pričeli julija 2025. Trenutno so vsa rušitvena dela starega prizidka osnovne šole s telovadnico zaključena in območje gradnje smo predali v pregled arheologom.





v gradnji

Vrtec Galjevica

Projektant: SAMOATELJE, d. o. o.

Izvajalec: ANDE INŽENIRING, d. o. o.

Začetek gradnje: avgust 2024

Predviden zaključek: november 2025

Vrednost gradbenih del brez DDV: 13.000.000 €

Namen in cilj projekta:

Projekt obsega **izgradnjo novega Vrtca Galjevica** z ukrepi za izboljšano potresno in požarno varnost, potrebnimi kvalitativnimi izboljšavami, izgradnjo dodatnega večnamenskega prostora, centralne kuhinje, pralnice in ureditvijo zunanjih igralnih ter zelenih površin ob obstoječi enoti Galjevica. Zgradili bomo tudi novo zaklonišče zasuto z zemljino in ozelenjeno, ki bo omogočalo dodaten zunanji igralni prostor.



Avgust 2025 - trenutno stanje projekta:

Trenutno se izvajajo inštalacije za elektro in strojna dela. Izvaja se montaža stavbnega pohištva in strehe.





v gradnji

Vrtec Trnovo

Projektant: DOBRIN ARHITEKTI, d. o. o.

Izvajalec: VG5, d. o. o.

Začetek gradnje: marec 2025

Predviden zaključek gradnje: junij 2026

Vrednost gradbenih del brez DDV: 6.700.000 €

Namen in cilj projekta:

Porušili smo staro dotrajano enoto vrtca na Karunovi in **zgradili bomo novo enoto**, ki bo obsegala 12 oddelkov z vsemi servisnimi prostori in spremljevalnimi programi, kuhinjo, pralnico, igriščem in parkiriščem ter bo z zakloniščem in s podzemno doživljajsko potjo povezana s prenovljenim objektom vrtca Kolezijska.



Avgust 2025 - trenutno stanje projekta:

Izvaja se prestavitev komunalne infrastrukture. Izvedena je temeljna plošča nepodkletenega objekta.





v pripravi

OŠ Kolezija – Nova šola

Projektant: ATELJE HOČEVAR, d. o. o.

Izvajalec: /

Predviden začetek gradnje: /

Predviden zaključek gradnje: /

Predvidena vrednost gradbenih del brez DDV:

5.500.000 €

Opis projekta:

Projekt obsega rušitev obstoječega objekta, izgradnjo novega objekta s pripadajočimi zunanji površinami za potrebe prve triade (10 oddelkov) OŠ Kolezija.



Avgust 2025 - trenutno stanje projekta:

V izdelovanju je projektna dokumentacija DGD in PZI.



v pripravi

OŠ Ketteja in Murna

Projektant: CURK ARHITEKTURA, d. o. o.

Izvajalec: /

Predviden začetek gradnje: 2026

Predviden zaključek gradnje: 2027

Predvidena vrednost gradbenih del brez DDV:
10.800.000 €

Opis projekta:

V okviru projekta je predvidena **celovita sanacija obstoječega Navinškovega objekta**, rušenje pomožnega samostojnega objekta (dislocirana razdelilna kuhinja in jedilnica, zobna ambulanta). Izvedena bo prenova in preureditev male telovadnice, novogradnja velike telovadnice, nova centralna kuhinja in jedilnica.



Avgust 2025 - trenutno stanje projekta:

V izvajanju je PZI projektna dokumentacija.



v pripravi

OŠ Majde Vrhovnik

Projektant: ARHITEKTONIKA, d. o. o.

Izvajalec: /


Predviden začetek gradnje: 2026

Predviden zaključek gradnje: 2027

Predvidena vrednost gradbenih del brez DDV:
11.300.000 €

Opis projekta:

V okviru projekta je predvidena **celovita energetska, zunanja in notranja prenova osnovne šole z dozidavo objekta in zunanjo ureditvijo** – celovito obnovo igrišča ter ureditev območja parkiranja.

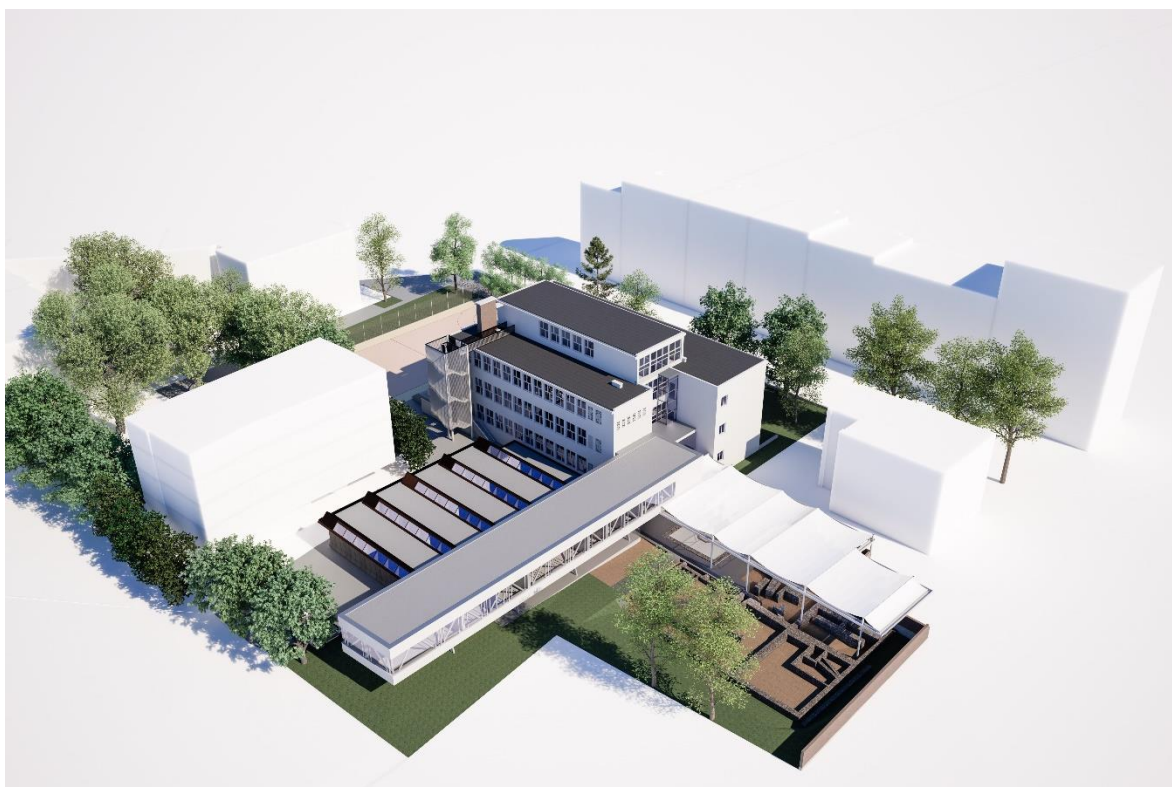

Avgust 2025 - trenutno stanje projekta:

Izdela je DIIP, poteka urbanistično in prostorsko preverjanje pogojev za izvedbo gradnje.
